

Nieuwbouw De Hoorn

Samen bouwen aan toekomstbestendige zorg



Vijftiende nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de 15^e nieuwsbrief over de nieuwbouw van Zonnehuis de Hoorn in Marum.

Voor de zomervakantie zijn we verhuist naar de nieuw locatie. Het wonen en werken in het nieuwe pand bevalt goed!

Afbeelding 1: onderonsje in de gezamenlijke huiskamer



We gebruiken de tijdelijke entree aan de andere kant van het gebouw en het is daardoor soms op de begane grond nog improviseren. De officiële opening vindt medio april 2023 plaats.

Sloop oude gebouw

Inmiddels is bouwvakvakantie voorbij en is de aannemer daadwerkelijk begonnen met de sloop van het oude pand.

Afbeelding 2: sloop gevel oude gebouw



Afbeelding 3: de sloop is vergevorderd



Afbeelding 4: de oude gangen



Er is helaas wat meer asbesthoudend materiaal aangetroffen. De sloop loopt daarom iets achter op planning.


De komende weken wordt er dicht bij de nieuwbouw gesloopt. Dit doen we heel zorgvuldig. We schermen de nieuwbouw af met een metalen schot tijdens de sloop van de muren.

Start tweede bouwphase

We verwachten dat we eind september, volgens planning, kunnen starten met het uitzetten van het terrein voor de tweede bouwphase.

In de tweede bouwphase wordt de entree, de ontmoetingsruimte, een toilet en kantoor gerealiseerd op de begane grond. We verwachten de nieuwbouw in maart 2023 af te ronden.

Afbeelding 5: Aanbouw tweede bouwphase (geel)

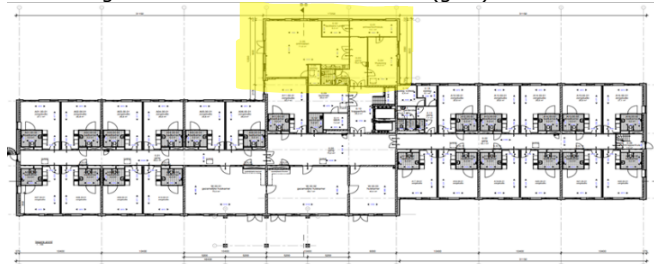

Centrale ontmoetingsruimte

De centrale ontmoetingsruimte heeft openslaande deuren naar het buitenterras.

Afbeelding 6: Voorlopig ontwerp ontmoetingsruimte



Afbeelding 7: zij aanzicht centrale ontmoetingsruimte



Planning en werkzaamheden

September t/m november 2022:

- ✓ Bouwterrein verder klaar maken
- ✓ Boorgaten maken (03/10)
- ✓ Fundament leggen (18/10)

Colofon

Deze nieuwsbrief van Zonnehuisgroep Noord kunt u ook vinden op www.zonnehuisgroepnoord.nl.

Vragen en/of tips? Mail deze naar Ingrid Stiekema, projectleider De Hoorn, i.stiekema@zonnehuisgroepnoord.nl.
